

Informe de Gestión y Cierre

Sprint 1

Proyecto: ConstructoCompare PRO

Periodo: 23 de Marzo - 03 de Abril

Estado: Finalizado

CORRECCIÓN SPRINT 1 – AJUSTE DE TRAZABILIDAD DE HISTORIAS DE USUARIO

Nota de Actualización del Sprint

Durante la consolidación final del proyecto se realizó una reorganización del backlog del Sprint 1 con el objetivo de mejorar la trazabilidad y distribución del trabajo. Como resultado, se redefinió la estructura de historias de usuario asignando una HU principal por integrante del equipo, manteniendo el mismo alcance funcional originalmente comprometido.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo del Sprint:

Implementar la infraestructura base del sistema mediante persistencia de usuarios, autenticación segura, motor inicial de scraping, interfaz de usuario y validación de integridad operativa.

Historias de Usuario Seleccionadas:

- HU-J1 – Infraestructura de Datos y Persistencia de Usuarios (8 pts)
- HU-S1 – Implementación del Motor de Búsqueda y Extracción Base (8 pts)
- HU-I1 – Desarrollo de Interfaz de Usuario e Interacción Base (8 pts)
- HU-G1 – Aseguramiento de Calidad, Integridad y Seguridad (8 pts)

Capacidad del Equipo:

80 horas hombre (4 integrantes × 20 horas efectivas)


3. SPRINT BACKLOG (DETALLE TÉCNICO)

ID Tarea	Descripción Técnica	HU Correspondiente	Responsable	Esfuerzo (Fibonacci)	Estado
T1.1	Diseño de tabla Users, persistencia y esquemas de validación	HU-J1	Javiera	3	Listo
T1.2	Implementación de autenticación segura, hash de contraseñas y emisión JWT	HU-J1	Javiera	5	Listo

T1.3	Desarrollo del motor de búsqueda inicial y configuración del scraper Sodimac	HU-S1	Samuel	5	Listo
T1.4	Construcción de schemas de extracción, endpoint de búsqueda y conexión externa	HU-S1	Samuel	3	Listo
T1.5	Desarrollo del portal Login/Registro y navegación inicial	HU-I1	Israel	3	Listo
T1.6	Implementación de visualización de resultados, filtros básicos y estados de carga	HU-I1	Israel	5	Listo
T1.7	Validación funcional inicial, revisión de integridad y pruebas de humo	HU-G1	Equipo de Desarrollo	5	Listo
T1.8	Configuración de entorno, pruebas iniciales y verificación transversal	HU-G1	Equipo de Desarrollo	3	Listo


4. GESTIÓN VISUAL (SCRUMBOARD Y BURNDOWN)

Scrumboard Final

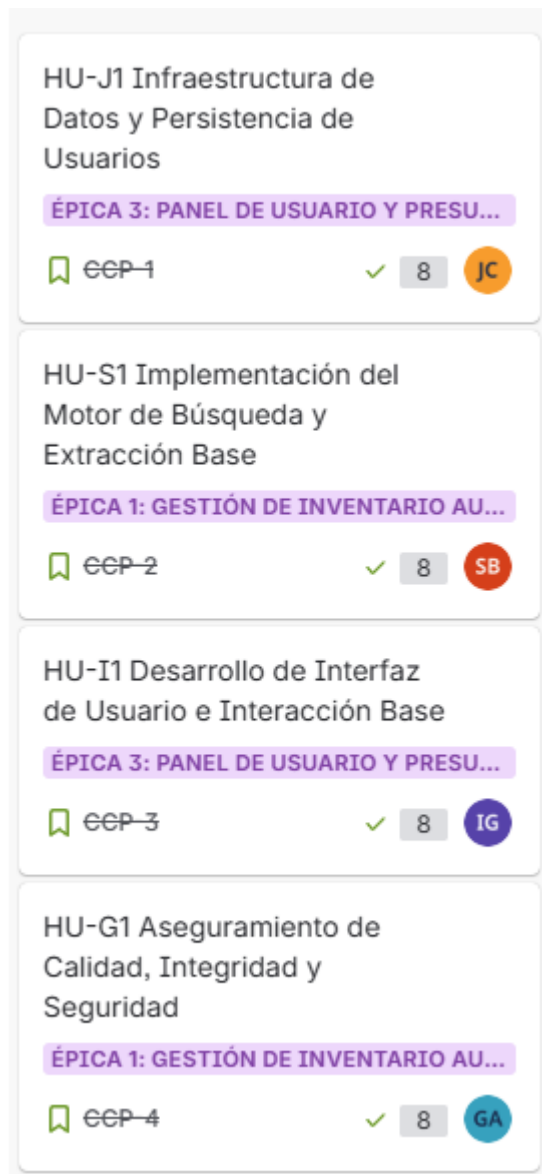

Al cierre del Sprint 1, el tablero de control (Scrumboard) refleja la finalización exitosa de las cuatro historias de usuario comprometidas. La transición de las tareas hacia la columna 'Hecho' fue validada por el rol de QA, asegurando que cada funcionalidad cumple con los criterios de aceptación técnicos y de negocio.

Burndown Chart

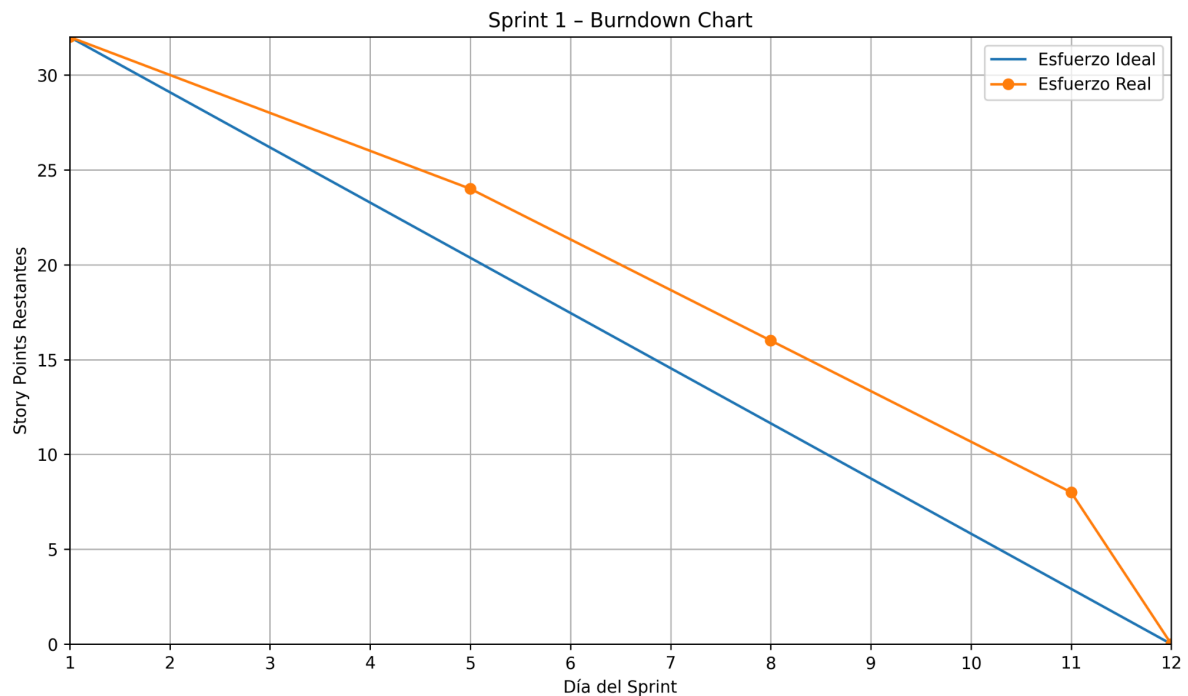

El gráfico de trabajo pendiente (Burndown Chart) del Sprint 1 refleja un avance progresivo durante el ciclo de construcción de la infraestructura base del proyecto. La reducción del trabajo pendiente se concentró en hitos asociados al desarrollo de persistencia, autenticación, interfaz inicial y motor de extracción.

Durante la primera etapa del sprint se consolidó la infraestructura de datos y el sistema de autenticación mediante persistencia segura y emisión de credenciales. Posteriormente se avanzó en la implementación del motor inicial de búsqueda y extracción junto con la construcción de la interfaz de usuario y los mecanismos de validación e integridad.

El cierre del sprint se realizó con la finalización de las cuatro historias comprometidas, alcanzando el 100 % del alcance planificado y dejando operativa la primera versión funcional del sistema.

Seguimiento del Burndown:

Día	Fecha	Pts Restantes (Real)	Hito
1	23/03	32	Inicio Sprint — Sprint Planning
5	27/03	24	Cierre HU-J1 — Infraestructura de Datos y Persistencia
8	30/03	16	Cierre HU-S1 — Motor de Búsqueda y Extracción Base

11	01/04	8	Cierre HU-I1 — Interfaz de Usuario e Interacción Base
12	03/04	0	Cierre HU-G1 — QA, Integridad y Seguridad
12	03/04	0	Cierre Sprint

5. DAILY MEETINGS (SÍNTESIS DE COORDINACIÓN)

Durante el Sprint 1 se realizaron reuniones diarias de seguimiento de 15 minutos orientadas a coordinar el levantamiento de la infraestructura base del proyecto, sincronizar el desarrollo entre backend, frontend y extracción de datos, y reducir riesgos técnicos durante la construcción inicial del sistema.

Se destacaron los siguientes hitos:

- 25/03: Coordinación entre Javiera y Samuel para definir contratos de datos y estructuras de validación entre el módulo de persistencia y el motor inicial de extracción, asegurando consistencia en el intercambio de información.
- 27/03: Revisión técnica del flujo de autenticación y persistencia de usuarios. Se validó el almacenamiento seguro de credenciales, el uso de hash de contraseñas y la emisión correcta de tokens JWT.
- 30/03: Israel presentó el avance de la interfaz inicial del sistema, incluyendo formularios de acceso, navegación y visualización preliminar de resultados obtenidos desde el buscador.
- 01/04: Se ejecutó una sesión de validación conjunta para revisar el funcionamiento integrado del flujo Registro → Login → Consulta → Visualización, identificando ajustes menores de estabilidad y sincronización.
- 03/04: Revisión final del sprint y validación funcional del Producto Mínimo Viable (MVP), confirmando el cumplimiento del alcance comprometido y dejando operativa la primera versión integrada del sistema.

6. REGISTRO DE IMPEDIMENTOS (IMPEDIMENT LOG)

ID	Descripción del Bloqueo	Impacto	Solución Aplicada
IMP-01	Incompatibilidad en la configuración de conexión asíncrona entre la aplicación y el servicio de base de datos durante la implementación inicial de persistencia.	Alto	Se ajustó la configuración de conexión y parámetros de acceso para asegurar compatibilidad con el flujo asíncrono y garantizar almacenamiento estable de usuarios.

IMP-02	Inconsistencias en el intercambio de estructuras de datos entre el motor de extracción y la capa de persistencia durante las primeras pruebas de integración.	Medio	Se estandarizaron esquemas de validación y modelos de intercambio utilizando contratos de datos para asegurar consistencia entre módulos.
IMP-03	Retrasos en la sincronización entre renderizado de interfaz y disponibilidad de datos provenientes del proceso de búsqueda inicial.	Bajo	Se incorporó manejo de estados de carga y validaciones adicionales para garantizar visualización estable de resultados al usuario.

Resumen del Sprint:

Los impedimentos registrados corresponden principalmente a desafíos propios de la construcción inicial de infraestructura y coordinación entre componentes del sistema. Todos los bloqueos fueron resueltos dentro del ciclo del sprint y no generan impacto sobre el alcance comprometido.

7. GESTIÓN DE CALIDAD (QA) Y DEVOPS

Bajo la supervisión del equipo, se ejecutó el control de calidad:

- **Validación:** Uso de modelos Pydantic como "Firewall de datos" para asegurar la integridad de los precios.
- **Tests de Humo:** Validación exitosa de flujo: Registro -> Login -> Búsqueda Sodimac -> Conversión UF.

8. RELEASE NOTES (INCREMENTO DE SOFTWARE)

Versión 0.1:

- Persistencia de usuarios operativa mediante base de datos.
- Sistema de autenticación basado en JWT y almacenamiento seguro de credenciales.
- Motor inicial de búsqueda y extracción conectado con Sodimac.
- Interfaz inicial con autenticación, búsqueda y visualización de resultados.
- Validaciones de integridad, seguridad y configuración de entorno.

9. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

Sprint Review

- En este sprint se construyeron los cimientos técnicos del proyecto mediante la implementación de infraestructura de usuarios, autenticación segura, motor inicial de búsqueda y extracción de datos, interfaz de usuario base y controles iniciales de integridad y calidad.
- Resultado del Sprint: Se entregó un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional que permitió validar el flujo integrado de registro, autenticación, búsqueda y visualización de información.
- Ajuste Documental del Backlog: Durante la consolidación final del proyecto se reorganizó la estructura de historias de usuario del Sprint 1 con el objetivo de mejorar la trazabilidad del trabajo y reflejar una distribución equitativa del esfuerzo. Como resultado, se definió una historia principal por integrante manteniendo el alcance funcional originalmente entregado y sin alterar el incremento desarrollado.
- Resultado de Gestión: Sprint finalizado con 32 Story Points completados, 4 historias cerradas y cumplimiento total del alcance comprometido.

Próximo sprint (Sprint 2):

Se priorizará la consolidación del motor asíncrono de extracción, la normalización de precios, el fortalecimiento de la calidad de datos y la integración de visualización con resultados reales obtenidos desde el sistema de scraping.

Sprint Retrospective

- Fortalezas: Alta coordinación técnica durante la etapa de construcción inicial y buena integración entre persistencia, extracción e interfaz.
- Fortalezas: Correcta validación del flujo completo entre autenticación, búsqueda y visualización durante las pruebas funcionales.
- Debilidades: Se subestimó el esfuerzo asociado a la configuración inicial del entorno y a la sincronización entre módulos en una arquitectura distribuida.
- Debilidades: Algunas tareas técnicas requirieron ajustes iterativos debido a dependencias externas y validaciones adicionales.
- Acciones de Mejora: Estandarizar contratos de datos entre módulos desde etapas tempranas para reducir retrabajo.
- Acciones de Mejora: Incorporar validaciones técnicas y controles de calidad desde el inicio del ciclo de desarrollo.

Nota de Gestión Técnica

El presente Sprint (23 de marzo al 03 de abril de 2026) fue gestionado inicialmente mediante bitácoras internas y tableros locales para acelerar la fase de construcción de infraestructura y validación técnica.

Con el objetivo de centralizar la trazabilidad y estandarizar el seguimiento del proyecto, el 04 de mayo de 2026 se realizó una migración integral de la información histórica hacia Jira.

Debido a esta migración retroactiva, algunos registros automáticos de fechas corresponden al momento de carga y no al periodo original de ejecución. No obstante, los Scrumboards, Burndown Charts y métricas incluidos en este informe fueron reconstruidos para representar fielmente el progreso real del sprint, garantizando consistencia documental y continuidad metodológica para los ciclos posteriores.
