

Informe de Gestión y Cierre

Sprint 2

Proyecto: ConstructoCompare PRO

Periodo: 06 de Abril – 17 de Abril

Estado: Finalizado

CORRECCIÓN SPRINT 2 – AJUSTE DE TRAZABILIDAD DE HISTORIAS DE USUARIO

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Sprint 2 se enfocó en consolidar la capacidad de extracción y procesamiento de datos mediante un motor asíncrono, incorporando mecanismos de normalización, control de calidad e integración visual con información real obtenida desde el sistema de scraping.

Durante este ciclo se fortaleció la arquitectura del proyecto mediante la incorporación formal de actividades de aseguramiento de calidad (QA), permitiendo validar consistencia de datos, trazabilidad de errores y estabilidad operativa antes de avanzar hacia etapas posteriores de comparación y análisis.

Se completó el 100 % del alcance comprometido para el sprint, alcanzando una velocidad de 23 Story Points distribuidos entre extracción de datos, normalización, calidad de ingesta e integración de interfaz.

Como resultado del incremento entregado, el sistema quedó preparado para procesar resultados reales con una experiencia de usuario optimizada y una base de datos estandarizada para su explotación en los siguientes ciclos del proyecto.

2. SPRINT PLANNING (PLANIFICACIÓN)

Objetivo del Sprint: Consolidar el motor asíncrono de extracción, normalizar la información obtenida y conectar la visualización con datos reales provenientes del sistema de scraping.

Historia de Usuario Seleccionadas:

- HU-S2.1 – Motor Asíncrono y Extracción Sodimac (8 pts)
- HU-J2.1 – Sanitización y Normalización de Precios (5 pts)
- HU-G2.1 – QA de Calidad de Ingesta y Logs (5 pts)
- HU-I2.1 – Visualización de Datos Reales y Lazy Loading (5 pts)

Capacidad del Equipo: 80 horas hombre. Se destaca la reestructuración de la carga de trabajo el 13/04 para integrar el rol de QA.

Criterios de cierre del Sprint:


- Motor asíncrono operativo y estable para extracción de datos.
- Datos normalizados y preparados para consumo posterior.
- Validación de calidad de ingesta y trazabilidad mediante registros de ejecución.
- Interfaz conectada con datos reales y experiencia optimizada mediante carga diferida (Lazy Loading).

3. SPRINT BACKLOG (TRAZABILIDAD Y ASIGNACIÓN)

ID Tarea	Descripción Técnica	HU Correspondiente	Responsable	Esfuerzo (Fibonacci)	Estado
T2.1	Configuración del motor asíncrono de extracción utilizando Playwright	HU-S2.1	Samuel	3	Listo
T2.2	Implementación de extracción estructurada de SKU, nombre, precio e imagen	HU-S2.1	Samuel	5	Listo
T2.3	Desarrollo de lógica de sanitización y limpieza de precios mediante expresiones regulares	HU-J2.1	Javiera	3	Listo
T2.4	Conversión y normalización numérica para preparación de cálculos posteriores	HU-J2.1	Javiera	2	Listo
T2.5	Validación de calidad de ingesta y verificación de consistencia de datos extraídos	HU-G2.1	Genara	3	Listo
T2.6	Implementación de registros de ejecución (logs) y documentación de errores de extracción	HU-G2.1	Genara	2	Listo
T2.7	Integración del frontend con datos reales provenientes del proceso de scraping	HU-I2.1	Israel	3	Listo
T2.8	Implementación de Lazy Loading y optimización de carga visual	HU-I2.1	Israel	2	Listo

4. GESTIÓN VISUAL (SCRUMBOARD Y BURNDOWN)


Scrumboard Final

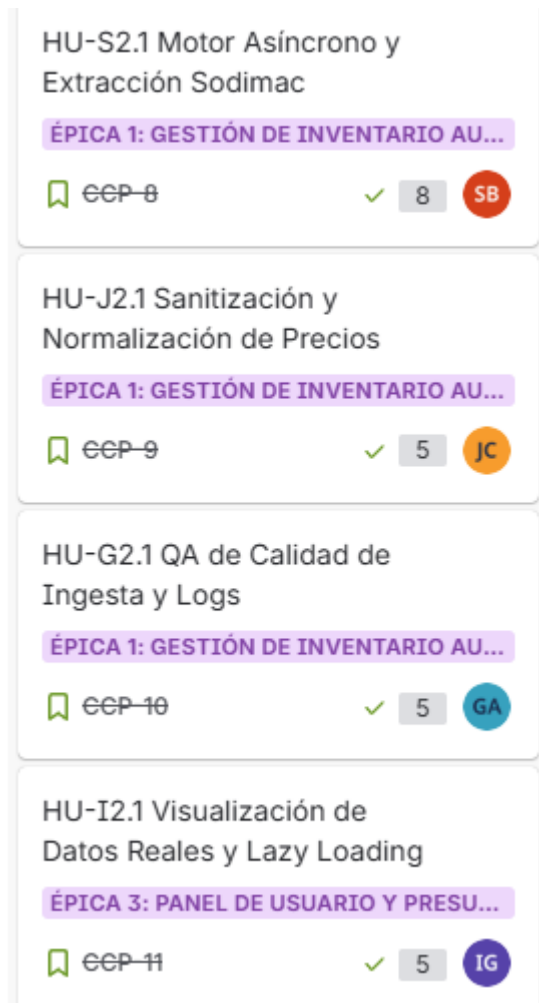

Al cierre del Sprint 2, el Scrumboard refleja la finalización completa de las cuatro historias de usuario comprometidas. El flujo de trabajo permitió visualizar la evolución desde el desarrollo del motor de extracción y procesamiento de datos hacia la validación de calidad e integración con la interfaz de usuario.

La distribución del trabajo mantuvo una trazabilidad clara por responsable y facilitó el control del avance técnico durante el sprint, permitiendo cerrar todas las tareas dentro del alcance comprometido.

Burndown Chart

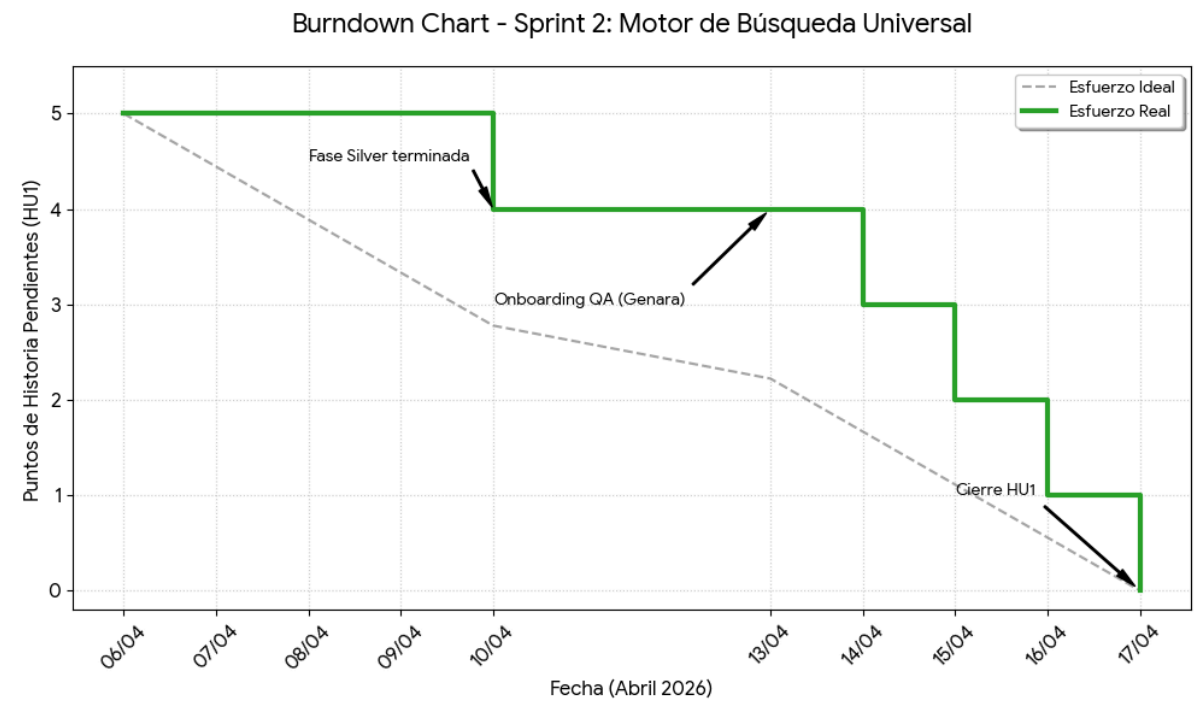

El gráfico de trabajo pendiente (Burndown Chart) del Sprint 2 muestra una fase inicial con una reducción moderada del esfuerzo debido al trabajo de consolidación técnica del motor de extracción y al avance paralelo del Estado de Avance 1.

El primer descenso significativo se produjo el **10 de abril**, con el cierre de la fase Silver y la estabilización del proceso de sanitización y normalización de datos, permitiendo disponer de una capa consistente para consumo posterior.

El **13 de abril** se integró formalmente Genara al flujo de trabajo como responsable de QA, incorporando validaciones de calidad de ingesta y trazabilidad mediante registros de ejecución, lo que permitió acelerar el cierre de actividades pendientes.

Posteriormente, el **14 de abril** se completó el primer bloque de historias comprometidas asociado al procesamiento y control de calidad, mientras que el **16 de abril** se finalizaron las actividades de integración visual y validación funcional.

Finalmente, el **17 de abril** se completó el trabajo restante y se realizó el cierre oficial del Sprint con **0 Story Points pendientes y el 100 % del alcance comprometido entregado**.

Seguimiento del Burndown:

Día	Fecha	Pts Restantes (Real)	Hito
1	06/04	23	Inicio Sprint — Sprint Planning
5	10/04	18	Finalización fase Silver y consolidación de normalización

8	13/04	13	Incorporación formal de Genara al proceso de QA
9	14/04	8	Finalización parcial de historias comprometidas
11	16/04	5	Cierre de integración visual y validación funcional
12	17/04	0	Cierre Sprint — 100 % del alcance completado

5. DAILY MEETINGS (SÍNTESIS DE COORDINACIÓN)

Durante el Sprint 2 se mantuvo la cadencia diaria de reuniones de seguimiento con una duración aproximada de 15 minutos, enfocadas en coordinar el avance del motor de extracción, asegurar consistencia en el procesamiento de datos y facilitar la integración progresiva entre scraping, calidad e interfaz.

Se destacaron los siguientes hitos de coordinación:

- 09/04: Se identificó una alta carga de procesamiento durante la ejecución del motor asíncrono. El equipo acordó optimizar el flujo de extracción y reorganizar la secuencia de procesamiento para mejorar estabilidad y tiempos de respuesta.
- 10/04: Se realizó la revisión y cierre de la fase Silver, validando reglas de sanitización, consistencia de precios y preparación de datos para consumo por capas superiores del sistema.
- 13/04: Incorporación formal de Genara al flujo de trabajo como responsable de QA. Se estableció una etapa de validación obligatoria para verificar calidad de ingesta, registro de errores y consistencia antes de consolidar entregables.
- 15/04: Se ejecutó una sesión de coordinación entre extracción e interfaz para estabilizar la visualización de resultados reales y ajustar tiempos de carga asociados al consumo de datos asíncronos.
- 16/04: Validación final del incremento del sprint mediante revisión integrada entre extracción, normalización, calidad e interfaz, dejando el sistema preparado para el cierre del ciclo.

6. REGISTRO DE IMPEDIMENTOS (IMPEDIMENT LOG)

ID	Descripción del Bloqueo	Impacto	Solución Aplicada
IMP-03.1	Alta carga de procesamiento durante la ejecución del motor asíncrono, generando variabilidad en tiempos de respuesta durante la extracción y procesamiento de datos.	Alto	Se optimizó el flujo de ejecución asíncrona y se reorganizó el procesamiento para reducir consumo de recursos y mejorar estabilidad.
IMP-04	Inconsistencias detectadas en formatos y representación de precios durante el proceso de sanitización y normalización de datos.	Medio	Se definieron reglas de limpieza y conversión numérica para estandarizar el tratamiento de precios antes del consumo por capas superiores.
IMP-05	Desfase temporal entre disponibilidad de datos procesados y renderizado de resultados en interfaz durante pruebas de integración.	Bajo	Se ajustó el flujo de carga visual mediante validaciones de estado y sincronización del consumo de datos reales.

7. GESTIÓN DE CALIDAD (QA) Y DEVOPS

Durante el Sprint 2 se formalizó la incorporación del proceso de Aseguramiento de Calidad (QA), incorporando actividades orientadas a validar estabilidad operativa, calidad de datos e integración funcional entre las capas del sistema.

Control de Calidad – Frontend

Se ejecutaron pruebas funcionales y de estrés orientadas a validar la correcta visualización de resultados reales provenientes del motor de extracción.

Casos ejecutados:

- TC-S2-01 – Carga de datos reales sin interrupciones: validación de búsquedas y carga progresiva mediante Lazy Loading. Resultado: PASSED.
- TC-S2-02 – Estrés de consultas consecutivas: ejecución de múltiples búsquedas verificando estabilidad del tiempo de respuesta. Resultado: PASSED.
- TC-S2-03 – Validación de renderizado de datos: se detectó un desfase temporal entre renderizado e inyección de datos asíncronos. Se documentó como hallazgo controlado y se definieron medidas de sincronización. Resultado: OBSERVACIÓN REGISTRADA.
- TC-S2-04 – Acceso concurrente y estabilidad visual: verificación de múltiples sesiones simultáneas manteniendo disponibilidad del sistema. Resultado: PASSED.

Control de Calidad – Scraping

Se ejecutaron pruebas orientadas a validar consistencia del procesamiento y calidad de datos.

Casos ejecutados:

- TC-S2-SC-01 – Validación de extracción y resiliencia del motor asíncrono. Resultado: PASSED.
- TC-S2-SC-02 – Prueba de rendimiento y monitoreo de recursos. Resultado: rendimiento estable bajo carga controlada.
- TC-S2-SC-03 – Auditoría de calidad sobre la capa Silver: validación de formatos numéricos, sanitización y consistencia de registros. Resultado: 100 % PASSED.

DevOps y Control Operacional

Durante el sprint se incorporaron prácticas de seguimiento técnico mediante registros de ejecución (logs), validación progresiva de entregables y controles de integración antes del cierre de actividades.

Resultado QA Sprint 2:

- Alta estabilidad del proceso de extracción.
- Calidad de datos validada para consumo posterior.
- Integración visual operativa con datos reales.
- Sin bloqueos críticos al cierre del sprint.

8. RELEASE NOTES (INCREMENTO DE SOFTWARE)

Versión 0.2

Nuevas funcionalidades incorporadas:

- Motor asíncrono de extracción implementado y estabilizado mediante procesamiento optimizado.
- Captura estructurada de información de productos incluyendo nombre, SKU, precio e imagen.
- Capa de sanitización y normalización de precios preparada para consumo posterior y cálculos internos.
- Incorporación de controles de calidad de ingesta y trazabilidad mediante registros de ejecución (logs).
- Integración del frontend con datos reales provenientes del sistema de extracción.
- Implementación de carga diferida (Lazy Loading) para optimizar tiempos de visualización y experiencia de usuario.

Mejoras técnicas:

- Reducción de inconsistencias en el tratamiento de datos durante el procesamiento.
- Mayor estabilidad en el flujo de extracción y presentación de resultados.
- Consolidación de la capa Silver como base para evolución funcional en ciclos posteriores.

Estado del Incremento:

Incremento validado y aprobado para continuar con la siguiente etapa del proyecto, manteniendo compatibilidad con la arquitectura definida y asegurando continuidad para el desarrollo del Sprint 3.

9. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

Sprint Review

- **Sprint anterior (Sprint 1):** Se construyeron los cimientos técnicos del sistema mediante la implementación de la infraestructura de usuarios, autenticación segura, un motor de scraping inicial enfocado en Sodimac y controles básicos de integridad operativa.
- **Este sprint (Sprint 2):** Se consolidó el Motor de Búsqueda Universal, logrando la extracción simultánea y normalización de datos (Bronze → Silver) para Sodimac, Easy e Imperial. Se implementó la carga optimizada (Lazy Loading) y se formalizó el rol de Aseguramiento de Calidad (QA) con la integración de Genara Alarcón. El ciclo finalizó el 17 de abril con el 100% del alcance comprometido y 0 puntos pendientes.
- **Próximo sprint (Sprint 3):** Se dará inicio al desarrollo del núcleo diferenciador del proyecto: el Motor de Comparación y Matching. Los objetivos estratégicos incluyen la implementación de la Capa Gold (unificación de catálogo bajo ID Maestro mediante algoritmo Union-Find), el desarrollo del endpoint de comparación de precios y la vista Side-by-Side con distinción de "Mejor Precio".

Sprint Retrospective

- **Fortalezas:** Alta capacidad de adaptación técnica y resolución ante cambios inesperados en las estructuras web de los retailers, asegurando la continuidad del motor de extracción.
- **Debilidades:** El inicio del sprint experimentó una fricción administrativa debido a la transición documental y el cierre de las actividades del Sprint 1.
- **Acciones de Mejora:** Adelantar la planificación del Sprint 3 al último jueves del ciclo actual, evitando solapamientos y asegurando un arranque técnico inmediato.

Nota de Gestión Técnica Se informa que este Sprint (06 al 17 de abril) fue gestionado originalmente mediante bitácoras de seguimiento técnico. El día 04 de mayo, toda la actividad fue migrada a Jira para centralizar la trazabilidad y estandarizar la documentación de cara a la defensa final del proyecto. Los gráficos y estados aquí presentados reflejan fielmente el avance real del equipo durante las dos semanas de ejecución.
